U D B U D S T I D S P L A N **0 2**
Pr. boligblok (blok 1), inkl. butik/garage

Aktivitet	Startdato	Slutdato
Murer- og betonarbejde	**06-09-2010**	**19-11-2010**
Etablering af stillads	06-09-2010	10-09-2010
Sydgavl udkradses og omfuges	13-09-2010	08-10-2010
Øvrigt murværk udkradses og omfuges	17-09-2010	15-10-2010
Gavle ommures mod tag	27-09-2010	15-10-2010
Sålbænke m.m.	13-09-2010	15-10-2010
Frihugning og genindmuring af baldakiner	13-09-2010	15-10-2010
Betonrenovering, inkl overfladebehandling	13-09-2010	15-10-2010
Dilatationsfuger i facade	20-09-2010	15-10-2010
Terrazzoarbejde i trappeopgange	13-09-2010	01-10-2010
Murværk langs terræn udkradses og omfuges m.m.	01-11-2010	19-11-2010
Konsolflytning på stillads	20-09-2010	15-10-2010
Nedtagning af stillads	21-10-2010	29-10-2010
Øvrigt murerarbejde	13-09-2010	19-11-2010
Malerarbejde	**15-09-2010**	**22-10-2010**
Malerbehandling af vinduer mod øst	24-09-2010	22-10-2010
Malerbehandling af vinduer mod vest	27-09-2010	15-10-2010
Øvrigt malerarbejde	15-09-2010	22-10-2010
Tagarbejde	**14-09-2010**	**22-10-2010**
Tagarbejde ved gavle	08-10-2010	22-10-2010
Øvrigt tagarbejde (pap inddæk og render)	14-09-2010	22-10-2010

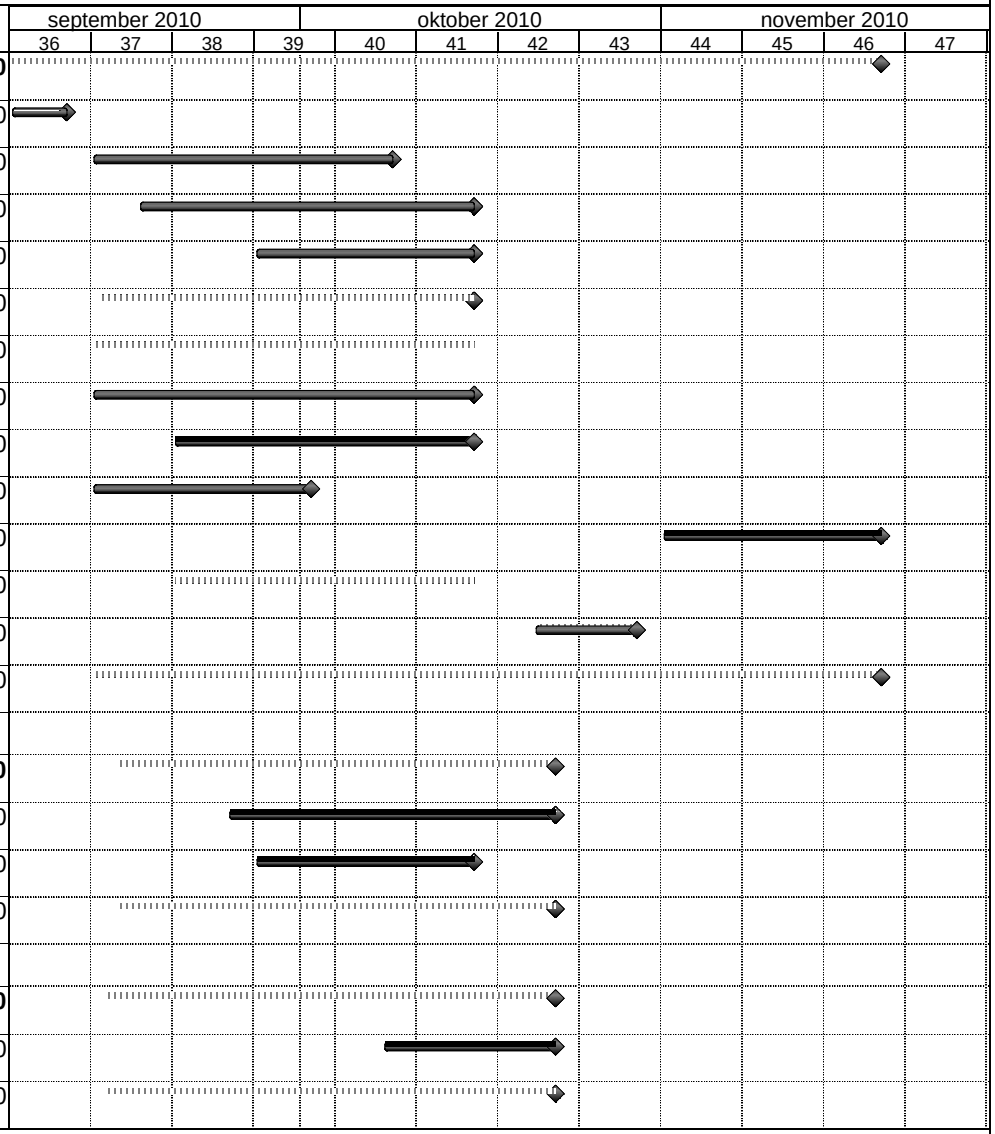

Sag: Ibstrupparken III, renovering sag nr. 314.003
Emne: Udbudstidsplan 02 - pr. boligblok, inkl. butik/garage
Dato: 2010.06.18

Angiver tidsperiode — Angiver sanktionsgivende dato

Angiver ikke kontinuerligt arbejde

FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S KULSVIERVEJ 150 2800 LYNGBY TELEFON 4593 4020 TELEFAX 4593 4010 Note: med forbehold for forsinkelser forårsaget af myndighedsbehandling, samt beslutninger fra bruger/bygherre
